


付録10．テストの品質管理及び進捗管理に関わるシグナルの事例

プロジェクト名称	a a aシステムb b b対応
工程	c c テスト

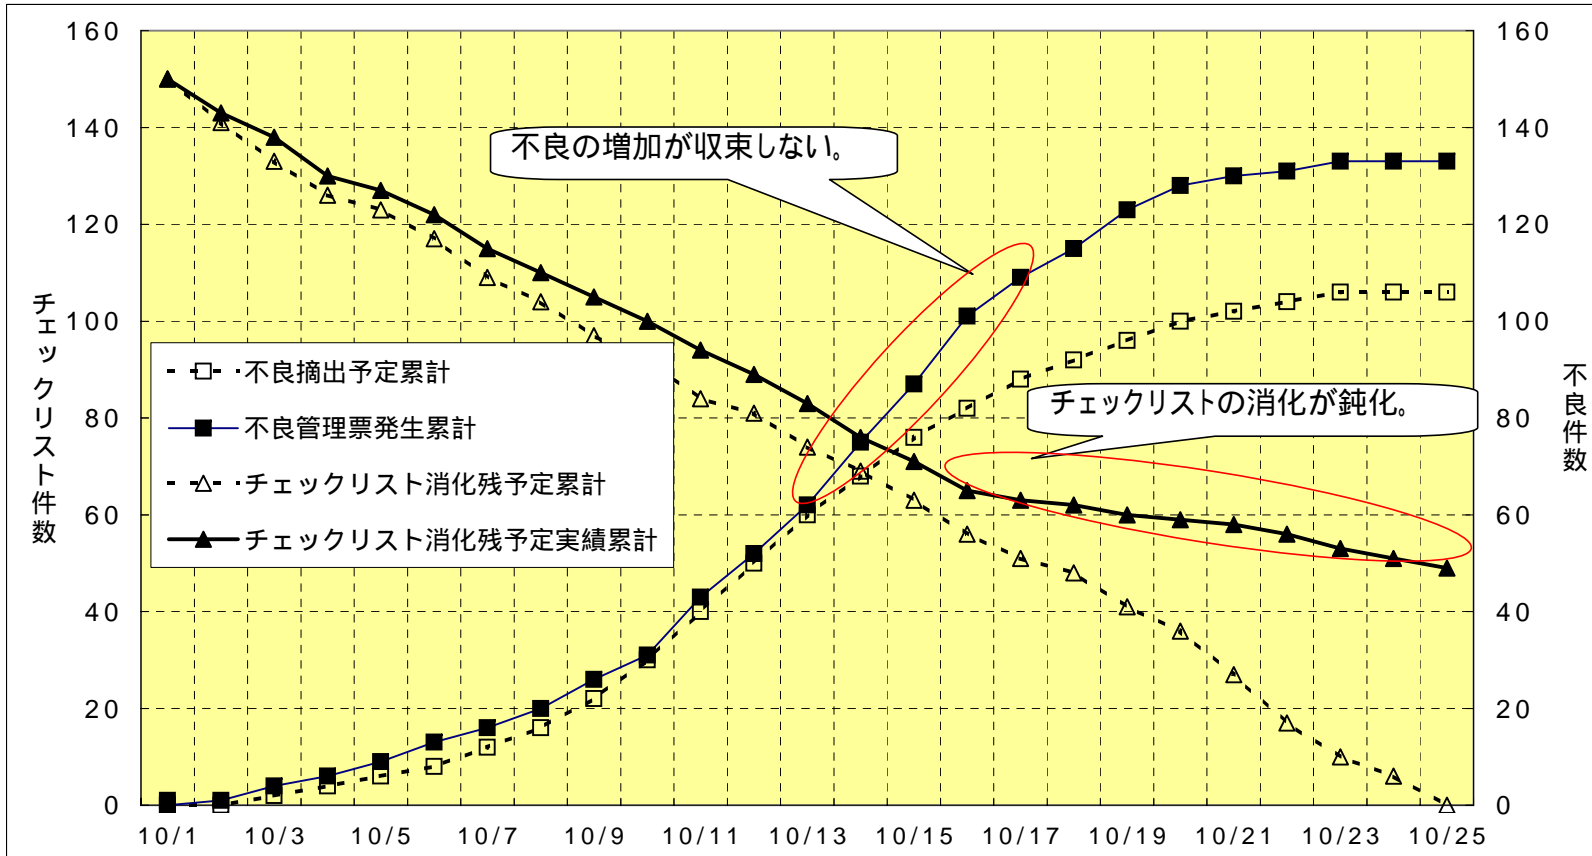

<解説>

あるプロジェクトのテスト工程のチェックリストの消化残数及び不良検出件数を示したものである。
 10/13から10/17の間、不良の増加が収束せず、品質に関わる問題(低品質等)が顕在化したシグナルとして捕らえるべきである。
 10/16以降、チェックリスト消化が鈍化しており、進捗に関わる問題(不良対応の体力不足等)が顕在化したシグナルとして捕らえるべきである。
